
# VET07 - Auszug wesentliche Meilensteine Lean Terminplan und Steuerungsterminplan

| Nr. | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Vergabe / Auftragserteilung** | **0 Tage** | **Mon 01.02.27** | **Mon 01.02.27** |
| 2 | | ***W&M KGR 400 gem. Steuerungsterminplan - Termine durch KI fortgeschrieben*** | **650 Tage** | **Mon 01.02.27** | **Fre 27.07.29** |
| 3 | | VET07 GA | 650 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 27.07.29 |
| 4 | | Abruf | 0 Tage | Mon 01.02.27 | Mon 01.02.27 |
| 5 | | Erstellung | 100 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 18.06.27 |
| 6 | | WuM Trassen / Kabelwege | 30 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 12.03.27 |
| 7 | | Prüfung WuM Trassen / Kabelwege | 15 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 02.04.27 |
| 8 | | WuM Automationsstationen, Kabel, Anlagenkennzeichnung, Anlagenbilder etc. | 60 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 04.06.27 |
| 9 | | Prüfung | 20 Tage | Die 08.06.27 | Mon 05.07.27 |
| 10 | | Überarbeitung | 10 Tage | Die 06.07.27 | Mon 19.07.27 |
| 11 | | Freigabe | 5 Tage | Die 20.07.27 | Mon 26.07.27 |
| 12 | | **Starttermine Gewerke (gem. LEAN-TP)** | **650 Tage** | **Mon 01.02.27** | **Fre 27.07.29** |
| 13 | | VET07 GA | 0 Tage | Mon 01.02.27 | Mon 01.02.27 |
| 14 | | Vorgezone Leistung Einbrinung Feuchtefühlerband Mediengang | 15 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 05.03.27 |
| 15 | | Vorgezogene Schachtinstallationen | 40 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 09.04.27 |
| 16 | | **Meilensteine (gem. LEAN-TP)** | **605 Tage** | **Mon 05.04.27** | **Fre 27.07.29** |
| 17 | | Musterlabor 3.OG fertig | 0 Tage | Mon 22.11.27 | Mon 22.11.27 |
| 18 | | Ausführung Ring 1 | 456 Tage | Mon 05.04.27 | Mon 01.01.29 |
| 19 | | Ausführung Ring 2 | 475 Tage | Mon 07.06.27 | Fre 30.03.29 |
| 20 | | **Inbetriebnahme/Qualifizierung 1.BA/Abnahmen (gem. STP)** | **320 Tage** | **Mon 08.05.28** | **Fre 27.07.29** |
| 21 | | **Inbetriebnahme** | **284 Tage** | **Mon 08.05.28** | **Don 07.06.29** |
| 22 | | RLT | 60 Tage | Fre 22.12.28 | Don 15.03.29 |
| 23 | | Gebäudeautomation | 80 Tage | Die 02.01.29 | Mon 23.04.29 |
| 24 | | Blower Door Test | 80 Tage | Mon 08.05.28 | Fre 25.08.28 |
| 25 | | Wirkprinzipprüfung | 10 Tage | Fre 27.04.29 | Don 10.05.29 |
| 26 | | 1:1 Test GA | 30 Tage | Fre 27.04.29 | Don 07.06.29 |
| 27 | | **Behördliche Abnahmen und Abnahmen nach Prüfverordnung** | **28 Tage** | **Fre 13.04.29** | **Die 22.05.29** |
| 28 | | Sachverständigneabnahme Brandschutz | 10 Tage | Fre 04.05.29 | Don 17.05.29 |
| 29 | | SV RLT | 15 Tage | Fre 13.04.29 | Don 03.05.29 |
| 30 | | Feuewehrabnahme Brandfallmatrix, Wirkprinzipprüfung | 1 Tag | Fre 18.05.29 | Fre 18.05.29 |
| 31 | | Behördliche Abnahmebegehung betriebsfertzige Fertigstellung | 2 Tage | Mon 21.05.29 | Die 22.05.29 |
| 32 | | Abnahmereife Fertigstellung | 0 Tage | Die 22.05.29 | Die 22.05.29 |
| 33 | | Probebetrieb | 15 Tage | Mon 11.06.29 | Fre 29.06.29 |
| 34 | | Mängelbeseitigung | 60 Tage | Mon 07.05.29 | Fre 27.07.29 |
| 35 | | Einweisungen | 50 Tage | Fre 27.04.29 | Don 05.07.29 |
| 36 | | **Revisionsunterlagen und VOB Abnahmen** | **120 Tage** | **Mit 13.12.28** | **Die 29.05.29** |
| 37 | | VET+VEL | 120 Tage | Mit 13.12.28 | Die 29.05.29 |

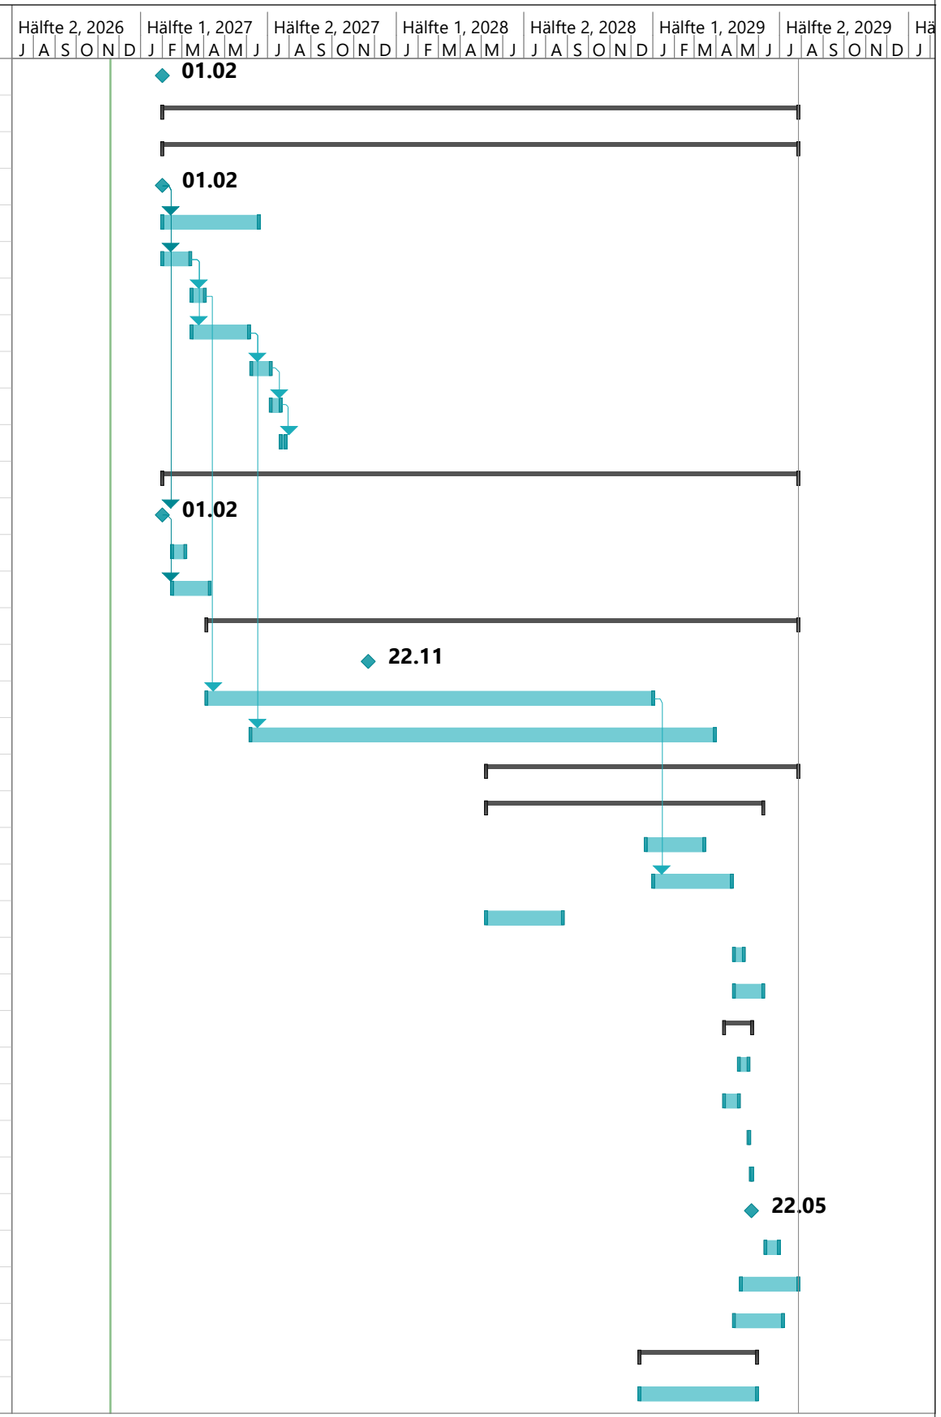


Projekt: 330_23_009_TGA_TP_2
Datum: Don 19.11.26

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | Projektsammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Anfang | Stichtag |
| Unterbrechung | Inaktiver Vorgang | Nur Dauer | Nur Ende | In Arbeit |
| Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Sammelrollup | Externe Vorgänge | Manueller Fortschritt |
| Sammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Externer Meilenstein | |
