
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Neubau Stallgebäude**	**362 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Fre 09.06.28**	
2	00 - Baustelleneinrichtung (Container Stellung)	6 Tage	Mon 01.02.27	Mon 08.02.27	
3	01 - Erd-Kanal- u. Entwässerungarbeiten	20 Tage	Fre 05.03.27	Mon 05.04.27	25
4	02 - Maurer- u. Stahlbetonarbeiten	115 Tage	Die 06.04.27	Die 31.08.27	3
5	03 - Stahlbauarbeiten (Halle)	40 Tage	Mit 01.09.27	Die 26.10.27	4
6	04 - Zimmermannsarbeiten	20 Tage	Mit 27.10.27	Die 23.11.27	5
7	04 - Zimmermann (Fassade)	40 Tage	Mit 24.11.27	Die 18.01.28	6
8	06 - Dachdeckerarbeiten	20 Tage	Mit 24.11.27	Die 21.12.27	6
9	07 - Gerüstbauarbeiten	185 Tage	Fre 28.05.27	Die 25.01.28	3EA+35 Tage
10	**08 - Trockenbauarbeiten**	**123 Tage**	**Mit 22.12.27**	**Fre 09.06.28**	**8**
13	09 - Innenputzarbeiten	14 Tage	Don 27.01.28	Die 15.02.28	50
14	10 - Fenster- u. Stahlblech-Außentüren	15 Tage	Mit 08.12.27	Die 28.12.27	6EA+10 Tage
15	**11 - Estricharbeiten**	**36 Tage**	**Mit 16.02.28**	**Mit 05.04.28**	
18	12 - Malerarbeiten (innen)	14 Tage	Don 06.04.28	Die 25.04.28	17
19	13 - Fliesenarbeiten	18 Tage	Don 06.04.28	Mon 01.05.28	17
20	**14 - Stahlzargen- u. Innentüren**	**77 Tage**	**Don 20.01.28**	**Fre 05.05.28**	
23	15 - Schlosserarbeiten	8 Tage	Mit 19.01.28	Fre 28.01.28	7
24	16 - Bodenbelagsarbeiten	7 Tage	Mit 26.04.28	Don 04.05.28	18
25	17 - Abbrucharbeiten	10 Tage	Fre 19.02.27	Don 04.03.27	33
26	18 - Garten-u. Landschaftsarbeiten	50 Tage	Mit 26.01.28	Die 04.04.28	9
27	19 - Zaunanlage	8 Tage	Mit 08.03.28	Fre 17.03.28	26AA+30 Tage
28	20 - Stalleinrichtung (1+8+9+10+11)	38 Tage	Mit 26.01.28	Fre 17.03.28	37EA+10 Tage
29	21 - Stalleinrichtung (2 - Fütterung)	18 Tage	Mon 20.03.28	Mit 12.04.28	28
30	22 - Stalleinrichtung (5 - Schlauchfenster+12 - Vogelschutz)	13 Tage	Mon 24.01.28	Mit 09.02.28	7EA+3 Tage
31	23 - Stalleinrichtung (4 - Tränketechnik)	17 Tage	Mon 20.03.28	Die 11.04.28	28
32	24 - Stalleinrichtung (6+7)	38 Tage	Mit 26.01.28	Fre 17.03.28	28AA
33	25 - Stalleinrichtung (3 - Fütterung-Silos)	8 Tage	Die 09.02.27	Don 18.02.27	2
34	26 - Stalleinrichtung (13 - Trennwände)	17 Tage	Mit 22.12.27	Don 13.01.28	8
35	27 - Stalleinrichtung (14 sonstige+15)	17 Tage	Mon 20.03.28	Die 11.04.28	28
36	28 - Stalleinrichtung (15 Hochdruck + Einweichanlage)	15 Tage	Mon 20.03.28	Fre 07.04.28	28
37	29 - Stalleinrichtung (16 Gülletechnik+17 Container)	15 Tage	Mit 22.12.27	Die 11.01.28	8
38	31 - Stalleinrichtung (19 Lüftung Jungsauen)	8 Tage	Mit 22.12.27	Fre 31.12.27	8
39	32 - Stalleinrichtung (Automation)	22 Tage	Mon 20.03.28	Die 18.04.28	28
40	39 - Fensterfolierung	2 Tage	Mit 10.05.28	Don 11.05.28	41
41	41 - Bauschlußreinigung	3 Tage	Fre 05.05.28	Die 09.05.28	43
42	42 - Umkleidespinte	4 Tage	Die 02.05.28	Fre 05.05.28	19
43	43 - Einbauküche	3 Tage	Die 02.05.28	Don 04.05.28	19
44	44 - Schließanlage	2 Tage	Mit 10.05.28	Don 11.05.28	41
45	45 - Lose Einrichtung	4 Tage	Mit 10.05.28	Mon 15.05.28	41
46	**46 - Datennetzte + Kommunikationstechnik**	**106 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Mit 24.05.28**	
49	**47 - Elektroarbeiten (Neu)**	**113 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Fre 02.06.28**	
52	**48 - Heizungsarbeiten**	**96 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Mit 10.05.28**	
55	**49 - Lüftungsarbeiten**	**97 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Don 11.05.28**	
58	**50 - Klimatisierungsarbeiten**	**96 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Mit 10.05.28**	
61	**51 - Sanitärarbeiten**	**101 Tage**	**Mit 29.12.27**	**Mit 17.05.28**	

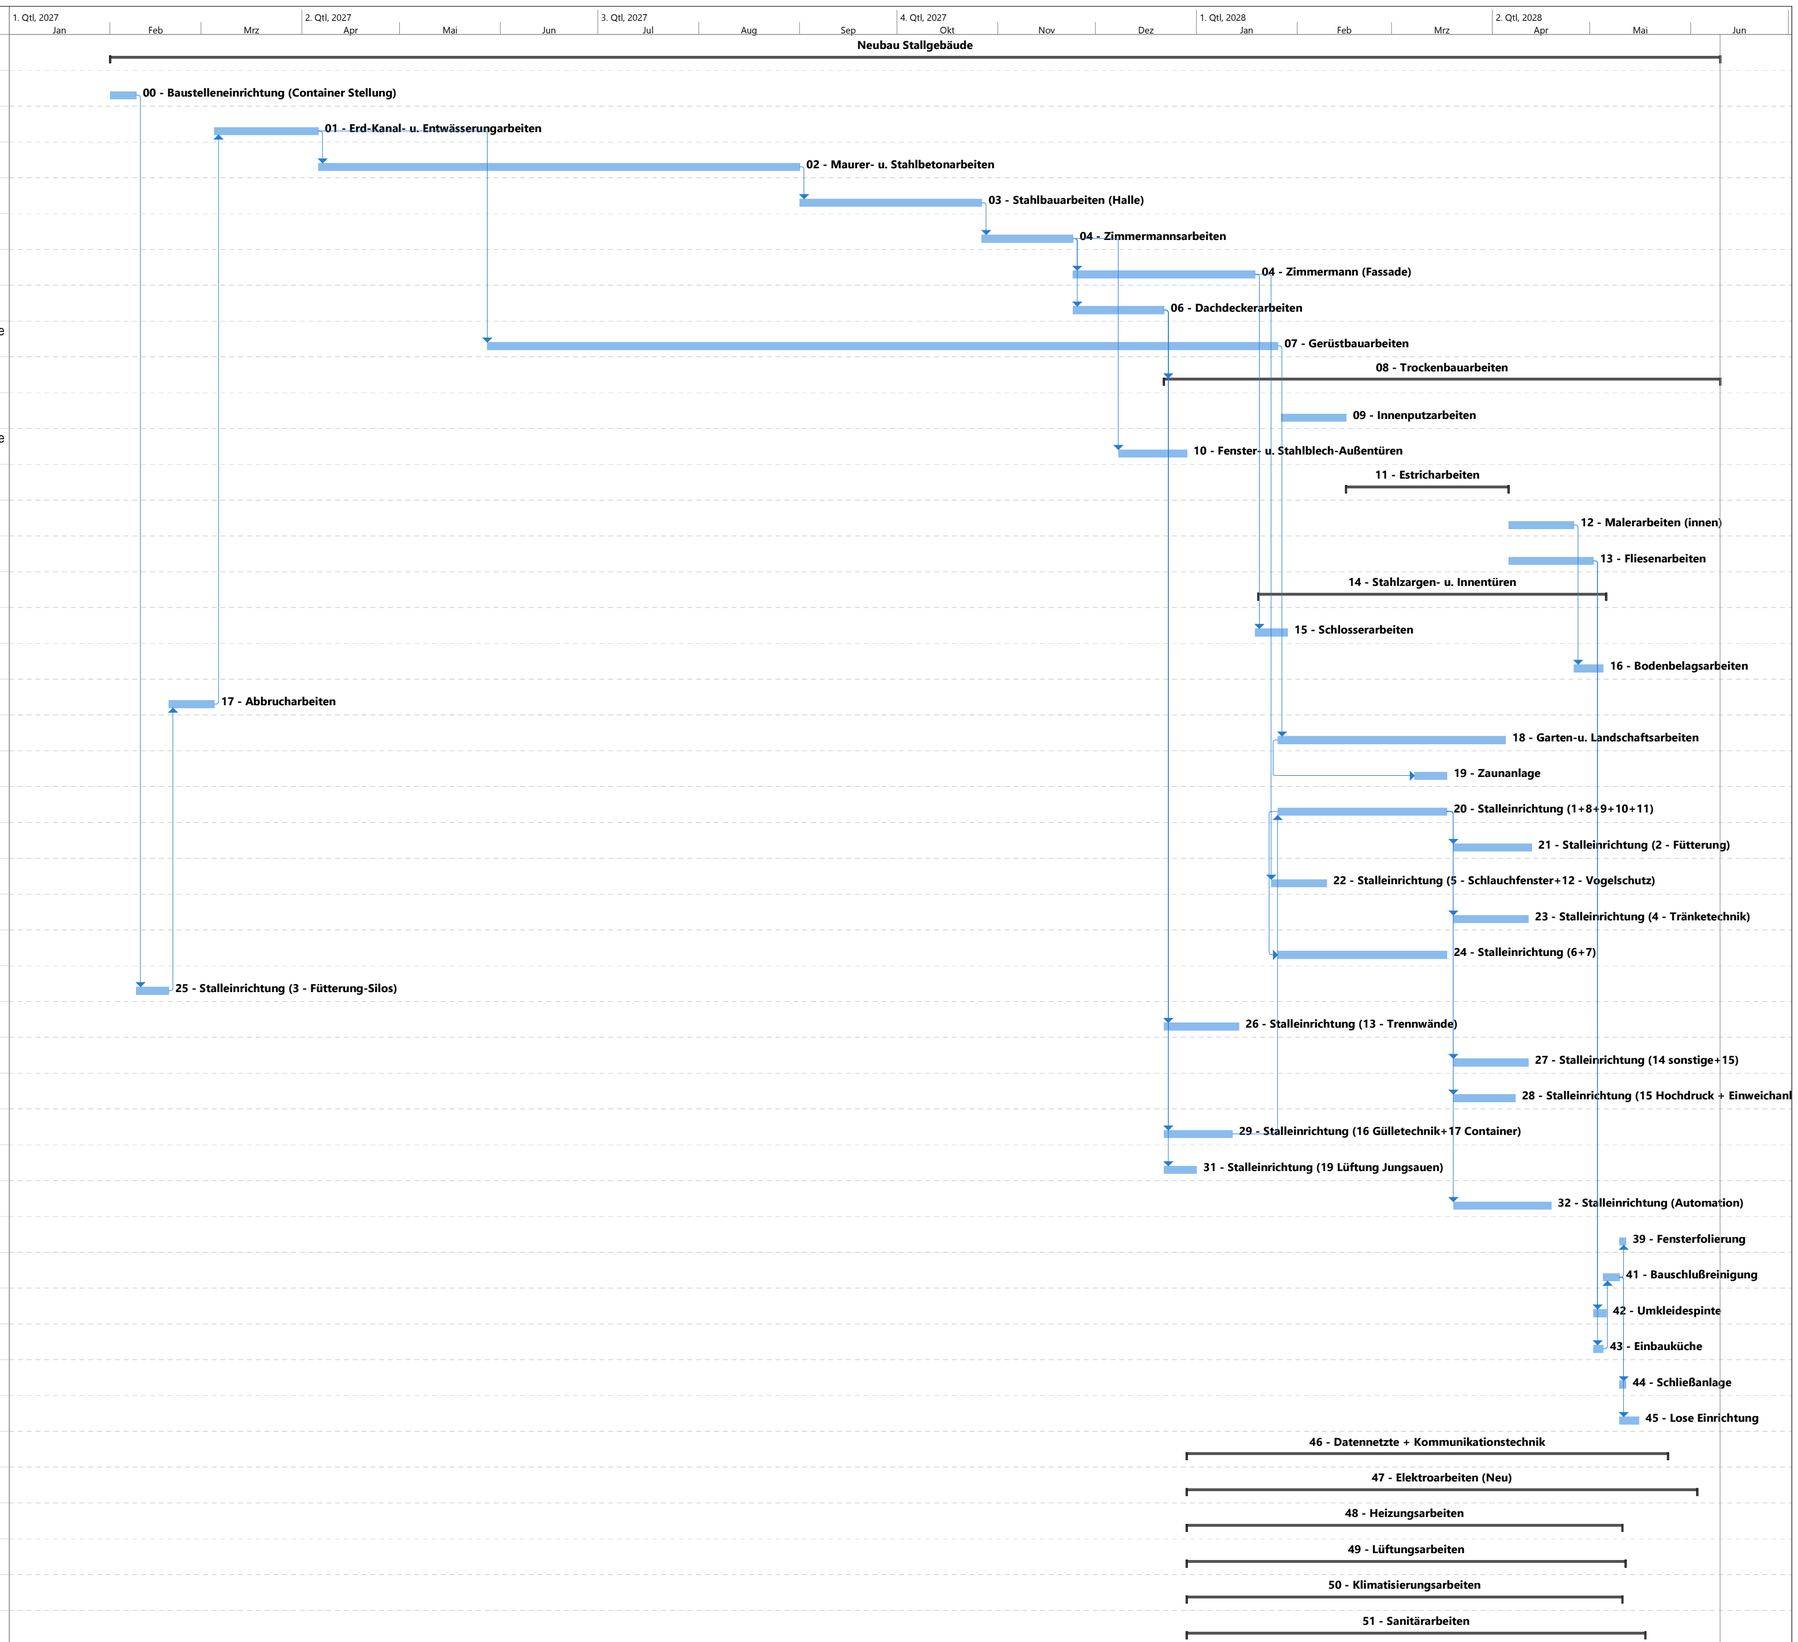

Projekt: HD-ZIS-BF2_BZP-Vora
Datum: Don 19.11.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
