Aufsteller: Frank Epping
Ansprechpartner EPLASS: Anna Beitnitz
Info: Terminberechnung erfolgt auf Basis von Werktagen (Mo. bis Sa.) nach Kalender **NRW**.

Index
0
a
b
c
...

AN

Prüflauf

Genehmigungslauf

Hinweis:*
Fachplaner AN ist dynamisch
- Fachplaner AN/NN1
- Fachplaner AN/NN2

Fachplaner AN *
Erstellung Unterlagen
6 Tage | 01a
U1

Fachplaner AN *
Abgelehnte Unterlagen
1 Tag | 01b
U1

Indexerhöhung

Indexerhöhung

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 01c
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Baufirma AN
Prüfung Unterlagen
3 Tage | 01c
U1a

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 02
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Plankoordinator AN
Prüfung Unterlagen
3 Tage | 02a
U2

Plankoordinator AN
Abgelehnte Unterlagen
1 Tag | 02b
U2

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 03
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Externer Prüfer AG
Vertragliche und fachtechnische Prüfung
12 Tage | 03

Straßen.NRW Vermessung
Vermessungstechnische Prüfung
12 Tage | 04a

Hinweis:
Weiterleitung nur mit Prüfbericht statisch möglich, bei Ablehnung nicht nötig

Prüfingenieur
Statisch konstruktive Prüfung
24 Tage | 04b
U3a

FÜ Stahlbau
Schweißtechnische Prüfung
12 Tage | 04c
U3b

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 04a-c
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Hinweis Filter:
wenn in einer der Aufgaben 04a, 04b, 04c mit Ablehnen weitergeleitet wurde, gehen die Dokumente direkt zurück in Aufgabe 02b

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 05
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Straßen.NRW R3
vertragliche und fachtechnische Prüfung
6 Tage | 05

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 06
- Gesehen
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- abgelehnt

Straßen.NRW R7
vertragliche und fachtechnische Prüfung
6 Tage | 06
U4

Hinweis Filter1000:
Verteilung an BÜ Filter von Block 7 (Dokumente)

Plankoordinator AN
Weitergabe zur Gleichstellung
3 Tage | 07

Indexerhöhung

Fachplaner AN *
Gleichstellung der Unterlagen
6 Tage | 08a

Fachplaner AN *
Abgelehnte Unterlagen
6 Tage | 08b

Indexerhöhung

Plankoordinator AN
Prüfung Gleichstellung
3 Tage | 09

09

Hinweis:
Wenn die Dokumente auf Aufgabe 10 weitergeleitet werden, dann ändert die Systemaufgabe 09_1 den Dokumentenstatus automatisch auf "geparkt".

Reinschrift | 10

Hinweis:
Die Rolle Bauüberwachung kann die Pläne entparken und in die Bestandsplanung weiterleiten.


Seite 2

Legende

- Automatische Zusammenführung
- Filter
- M — Mehrfachauswahl
- E — Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
- U — Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften„ geleistet wurden

Bestandsplanung

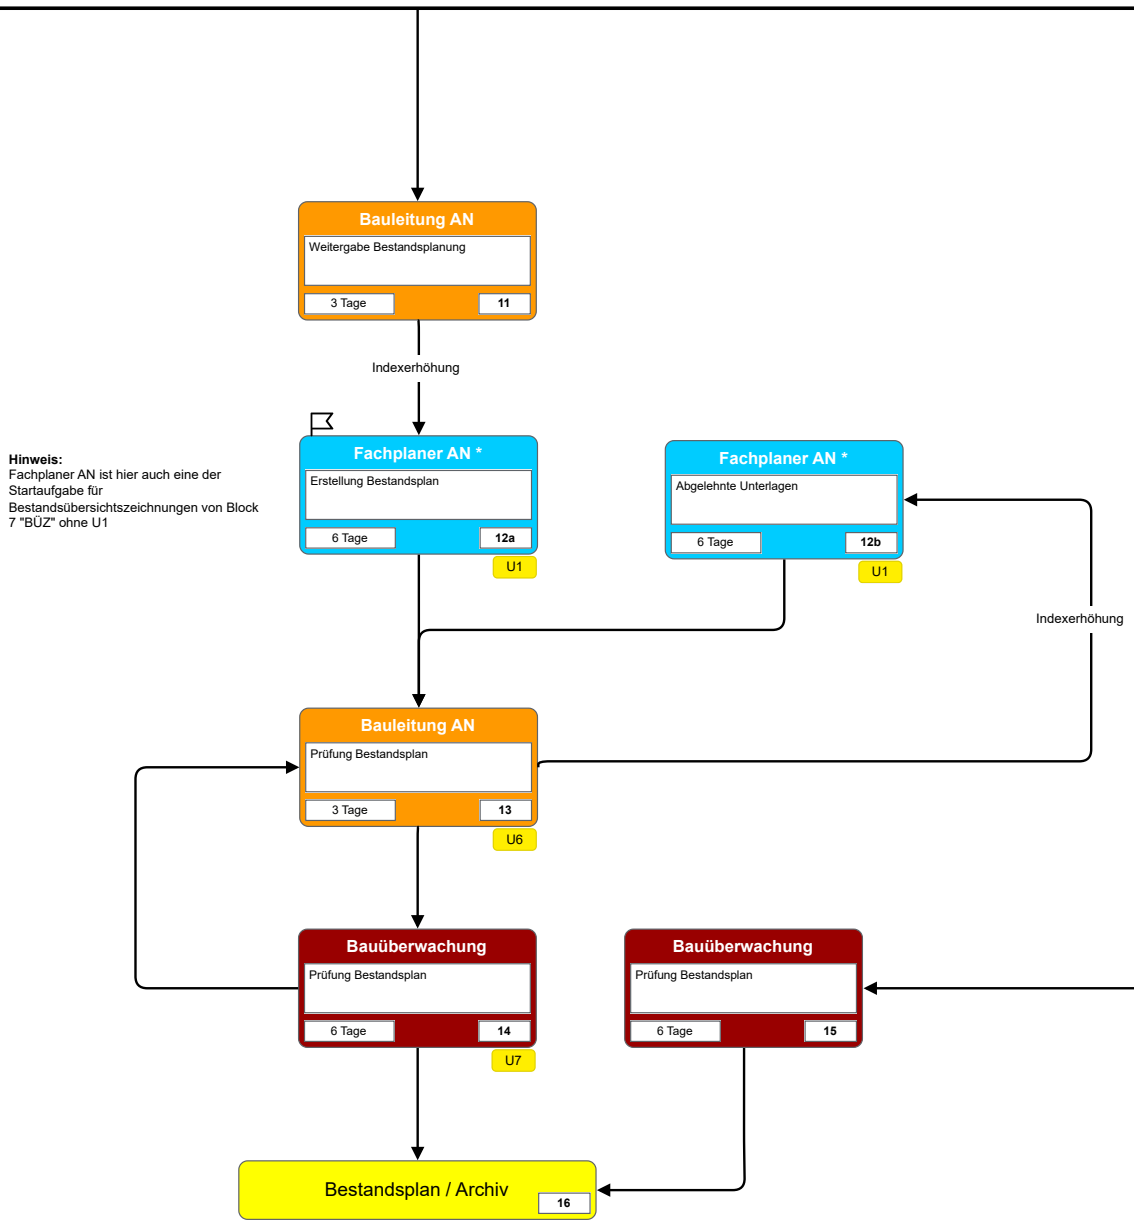

Legende

⤓	Automatische Zusammenführung
▽	Filter
M	Mehrfachauswahl
E	Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)
U	Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im Schriftfeld eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin angezeigt. In eckigen Klammern wird hierbei der Planindex angezeigt, auf dem die "Unterschriften„ geleistet wurden

Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als Beispiel zur Positionierung der EPLASS Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit dem AG abzustimmen.

Planspiegel A

Ausführungszeichnung

Für die Richtigkeit der Ausführungsunterlagen verantwortlich

Aufsteller:	Bauausführung:	Koordinator U2 Düsseldorf den 19.01.2023 gez. i.A. Musterfrau

Projekt-Nr.

	Datum	Zeichen
Bearb.	19.01.2023	
Gez.	19.01.2023	
Gepr.	19.01.2023	

Düsseldorf den 19.01.2023 gez. U1	Düsseldorf den 19.01.2023 gez. i.A. Mustermann U1a

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße:

Bauvorhaben:

Gemarkung:

Bauwerk:	Blatt-Nr.:
	Projekt-Nr.:
Plandarstellung: Block 1 Sohle, Wände	ASB-Nr. Maßstab: 1:50

Einwirkung: DIN EN 1991 — MLC = 50/50 - 100

Stempel des Prüfingenieurs/der Prüfingenieurin

In bautechnischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer: xxxx
Prüfbericht Nr.: xxxx
xxxx , den xxxx
Prüfingenieur für: xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx U3a
(Unterschrift)

Zur Bauausführung freigegeben

Zur Bauausführung freigegeben
Im Auftrag U4
(Unterschrift)

In schweiß- und korrosionstechnischer Hinsicht geprüft
Projektnummer: xxxx
xxxx , den xxxx
Qualitätssicherung Stahlbau und Korrosionsschutz
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx U3b
(Unterschrift)

Die Darstellung stimmt mit der Ausführung überein

Ausführende Firma Im Auftrag (Ort, Datum, Unterschrift)	Regionalniederlassung Münsterland, Bauüberwachung Im Auftrag (Ort, Datum, Unterschrift)

Planspiegel B

b			
a	Änderung	Datum	Name
Index	Änderung	Datum	Zeichen

Bestandszeichnung

Für die Richtigkeit der Ausführungsunterlagen verantwortlich

Aufsteller:	Bauausführung:	Koordinator U2
U1	U1a	Ort, Datum, Unterschrift
Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift	Projekt-Nr. AN-Intern

	Datum	Zeichen
Bearb.	01.01.2008	Name
Gez.	01.01.2008	Name
Gepr.	01.01.2008	Name

Region XX
Regionalniederlassung
Name der NL

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Straße: B 123

Bauvorhaben: Umgehung A-Stadt

Gemarkung: A-Stadt

Bauwerk: Unter-/Überführung
Bau-km 12+345.678 (BW ..)

Blatt-Nr.: 1

Projekt-Nr.: 12-3456

Plandarstellung:
Grundriss, Ansicht, Schnitte, Details

ASB-Nr. 1234 567

Maßstab: 1:100, 1:50, 1: 20

Einwirkung: DIN EN 1991 MLC = 50/50 - 100

Stempel des Prüfingenieurs/der Prüfingenieurin

In bautechnischer Hinsicht geprüft
Prüfnummer: xxxx
Prüfbericht Nr.: xxxx
xxxx , den xxxx
Prüfingenieur für: xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(Unterschrift)
U3a

Zur Bauausführung freigegeben

Zur Bauausführung freigegeben
Im Auftrag
U4
(Unterschrift)

In schweiß- und korrosionstechnischer Hinsicht geprüft
Projektnummer: xxxx
xxxx , den xxxx
Qualitätssicherung Stahlbau und Korrosionsschutz
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
U3b
(Unterschrift)

Die Darstellung stimmt mit der Ausführung überein

Ausführende Firma	Regionalniederlassung Musterregion, Bauüberwachung
Im Auftrag U6	Im Auftrag U7
(Ort, Datum, Unterschrift)	(Ort, Datum, Unterschrift)

Planspiegel C

c			
b			
a	Änderung	Datum	Name
Index	Änderung	Datum	Zeichen

Bestandsübersichtszeichnung

Region XX
Regionalniederlassung
Name der NL

Straße: B 123

Bauvorhaben: Umgehung A-Stadt

Gemarkung: A-Stadt

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Bauwerk: Unter-/Überführung
Bau-km 12+345.678 (BW ..)

Blatt-Nr.: 1

Projekt-Nr.: 12-3456

Plandarstellung:
Grundriss, Ansicht, Schnitte, Details

ASB-Nr. 1234 567

Maßstab: 1:100, 1:50, 1: 20

Einwirkung: DIN EN 1991

MLC = 50/50 - 100

Die Darstellung stimmt mit der Ausführung überein

Ausführende Firma Im Auftrag	Regionalniederlassung Musterregion, Bauüberwachung Im Auftrag
U6	U7
(Ort, Datum, Unterschrift)	(Ort, Datum, Unterschrift)

Stempelpalette

Prüfinstanz	Freigabe	2. Stempel	Freigabe mit Anmerkungen/ Zur Kenntnis genommen
Straßen.NRW R7	Zur Bauausführung freigegeben Im Auftrag U4 (Unterschrift)		Zur Bauausführung freigegeben Im Auftrag U4 Prüfeintragungen sind zu beachten! (Unterschrift)
Prüfingenieur	In bautechnischer Hinsicht geprüft Prüfnummer: xxxx Prüfbericht Nr.: xxxx x» , den xxxx Prüfingenieur für: xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx U3a (Unterschrift)		In bautechnischer Hinsicht geprüft Prüfnummer: xxxx Prüfbericht Nr.: xxxx xxxx , den xxxx Prüfingenieur für: xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx U3a (Unterschrift)
FÜ Stahlbau	In schweiß- und korrosionstechnischer Hinsicht geprüft Projektnummer: xxxx xxxx , den xxxx Qualitätssicherung Stahlbau und Korrosionsschutz xxxx xxxx xxxx xxxx U3b (Unterschrift)		In schweiß- und korrosionstechnischer Hinsicht geprüft Projektnummer: xxxx xxxx , den xxxx Qualitätssicherung Stahlbau und Korrosionsschutz xxxx xxxx xxxx xxxx U3b (Unterschrift)
